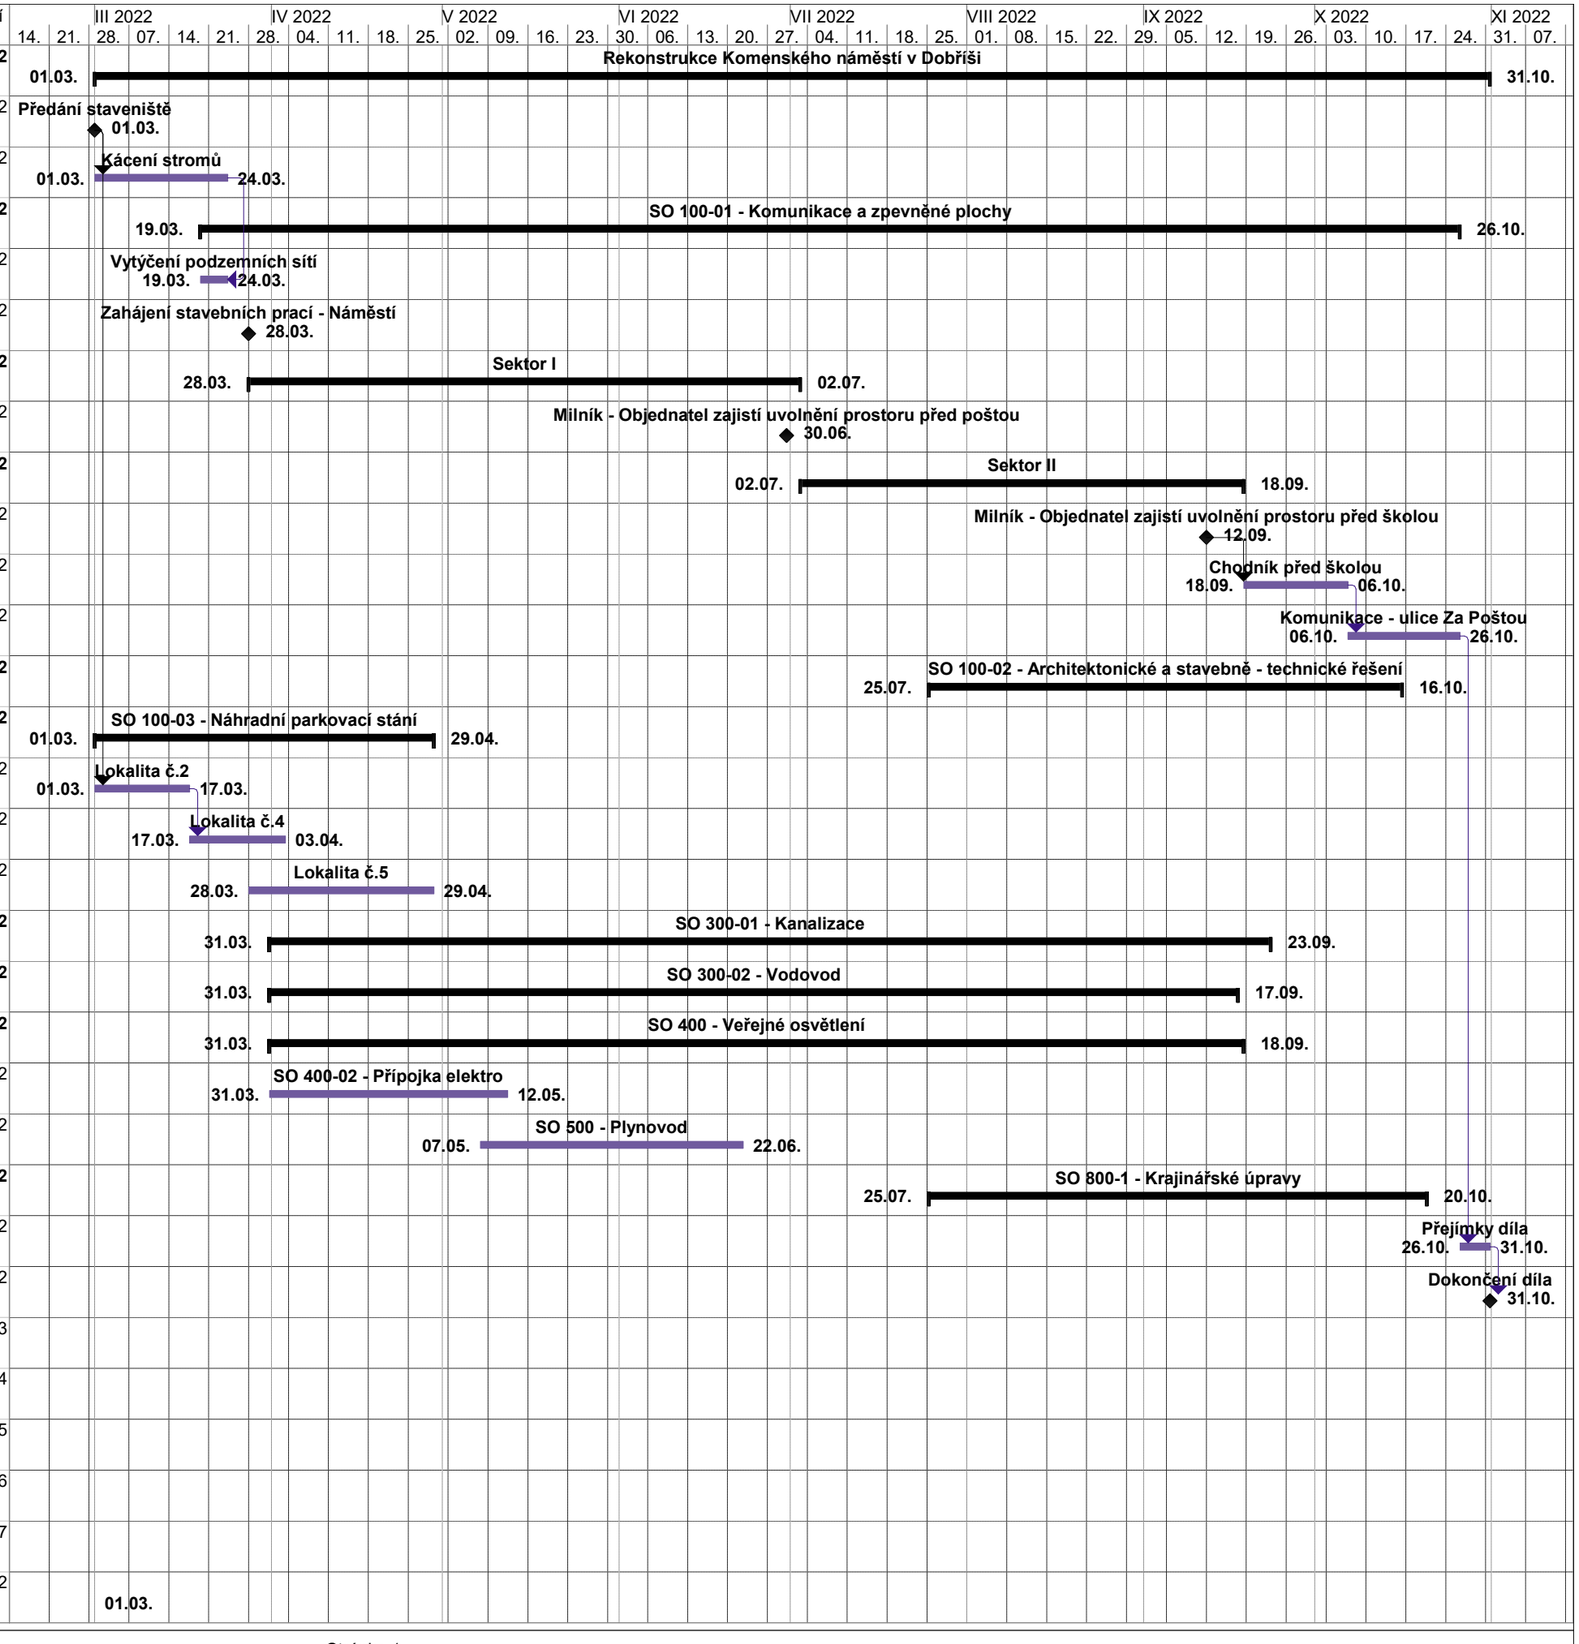ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Rekonstrukce Komenského náměstí v Dobříši**	**265,25 dny**	**01.03. 22**	**31.10. 22**
2	Předání staveniště	0 dny	01.03. 22	01.03. 22
3	Kácení stromů	25 dny	01.03. 22	24.03. 22
4	**SO 100-01 - Komunikace a zpevněné plochy**	**239,25 dny**	**19.03. 22**	**26.10. 22**
5	Vytýčení podzemních sítí	5 dny	19.03. 22	24.03. 22
6	Zahájení stavebních prací - Náměstí	0 dny	28.03. 22	28.03. 22
7	**Sektor I**	**105 dny**	**28.03. 22**	**02.07. 22**
11	Milník - Objednatel zajistí uvolnění prostoru před poštou	0 dny	30.06. 22	30.06. 22
12	**Sektor II**	**84 dny**	**02.07. 22**	**18.09. 22**
16	Milník - Objednatel zajistí uvolnění prostoru před školou	0 dny	12.09. 22	12.09. 22
17	Chodník před školou	20 dny	18.09. 22	06.10. 22
18	Komunikace - ulice Za Poštou	21 dny	06.10. 22	26.10. 22
19	**SO 100-02 - Architektonické a stavebně - technické řešení**	**90 dny**	**25.07. 22**	**16.10. 22**
23	**SO 100-03 - Náhradní parkovací stání**	**64,25 dny**	**01.03. 22**	**29.04. 22**
24	Lokalita č.2	18 dny	01.03. 22	17.03. 22
25	Lokalita č.4	18 dny	17.03. 22	03.04. 22
26	Lokalita č.5	35 dny	28.03. 22	29.04. 22
27	**SO 300-01 - Kanalizace**	**190 dny**	**31.03. 22**	**23.09. 22**
30	**SO 300-02 - Vodovod**	**184 dny**	**31.03. 22**	**17.09. 22**
33	**SO 400 - Veřejné osvětlení**	**185 dny**	**31.03. 22**	**18.09. 22**
36	SO 400-02 - Přípojka elektro	45 dny	31.03. 22	12.05. 22
37	SO 500 - Plynovod	50 dny	07.05. 22	22.06. 22
38	**SO 800-1 - Krajinářské úpravy**	**95 dny**	**25.07. 22**	**20.10. 22**
40	Přejímky díla	6 dny	26.10. 22	31.10. 22
41	Dokončení díla	0 dny	31.10. 22	31.10. 22
42	SO 800-2-1 - Krajinářské úpravy - následná péče 1.rok	0 dny	01.06. 23	01.06. 23
43	SO 800-2-2 - Krajinářské úpravy - následná péče 2.rok	0 dny	01.06. 24	01.06. 24
44	SO 800-2-3 - Krajinářské úpravy - následná péče 3.rok	0 dny	01.06. 25	01.06. 25
45	SO 800-2-4 - Krajinářské úpravy - následná péče 3.rok	0 dny	01.06. 26	01.06. 26
46	SO 800-2-5 - Krajinářské úpravy - následná péče 5.rok	0 dny	01.06. 27	01.06. 27
47	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0 dny	01.03. 22	01.03. 22
